

浙江工商大学
文体中心（亚运手球比赛馆）改造提升工程
工作简报

（2020 年二季度主要工作）

2020 年第 3 期（总第 3 期）

校园建设管理处编

二〇二〇年七月

目 录

● 工作备忘.....	1
● 施工现场.....	3
● 工作检查.....	7
● 安全防疫.....	9

工作备忘

一、工作事记：

4月3日、5月9、22日、6月5、18日 亚组委场馆部对项目施工进度进行了检查，并与各方协调解决项目存在的问题和困难。

4月13日、5月28日、6月24日 校建处会同学校纪检办、保卫处、后勤中心及疫情防控办等相关部门人员对项目进行了安全文明施工及防疫专项检查。

5月10日 质监站对项目进行了“星期天”工程师专项检查。

5月21日 省纪委有关领导至项目现场调研指导。

5月22日 第二次图纸会审，亚运场馆改造施工图设计已基本完成。

6月9日 亚组委场馆部邀请了市城建档案馆及建设局相关专家对本项目进行了档案和建筑材料资料的专项检查。

6月10、12日 市公安局与钱塘新区公安局分别至项目现场，了解和协调场馆安保相关事宜。

6月11日 赴浙一建，就工程建设过程中的疫情防控、廉政防控、进度质量安全把控等分别提出要求，并商定双方建立领导层面的定期沟通机制。

6月12日 教育厅教育发展中心领导对项目复工以来的工程进度情况进行了检查。

6月17日 浙一建副总柯步敏一行回访学校，就学校关于项目提出的各项要求进行逐一反馈，并表示公司会全力以赴，保质保量，按期完成项目建设任务。

6月19日 钱塘新区供电公司下沙供电所，召开区域内亚运场馆供电方案评审会，通过我校10KV供电改造方案。

二、工程进度：

截至 6 月底，项目主要工程进展如下：

- （1）主馆拆除工作完成：变更墙体拆除；吊顶地面墙面装饰拆除；需改造的弱电等线管拆除清理；
- （2）消防管道更换完成，消防栓箱及支管安装完成；
- （3）强电墙面线管预埋安装完成 80%；
- （4）卫生间、淋浴间墙面瓷砖凿除完成；一层卫生间、淋浴间墙面给水排水管预埋安装完成；二层卫生间墙面给水排水预埋完成；
- （5）空调冷媒管安装完成 20%；
- （6）一层场馆外清水混凝土挂板钢龙骨安装完成 40%、地坪浇筑完成，零星粉刷完成；
- （7）主馆新增马道安装完成 60%；
- （8）新增电梯基础及二层楼板砼施工完成；
- （9）部分风管、消防排烟管完成加工；
- （10）副馆消防主管拆除完成，消防主管道更换安装完成 30%，弱电桥架按完成 400 米，弱电墙面线管预埋安装完成，强电线管预埋安装完成；
- （11）安检备勤用房基础施工土方回填完成，钢膜结构图纸深化完成，钢结构材料加工中；
- （12）施工区域内室外消防管道安装并试压完成，开始回填；弱电线管、弱电井砌筑完成 200 米；
- （13）施工区域内意杨树砍伐完成，苗木迁移完成；
- （14）东看台北侧室内墙体拆除清理完成 80%。

施工现场

👉 安检备勤用房独立基础及地梁施工。




👉 墙体加气混凝土砌块砌筑。



👉 主馆电气线路安装施工。




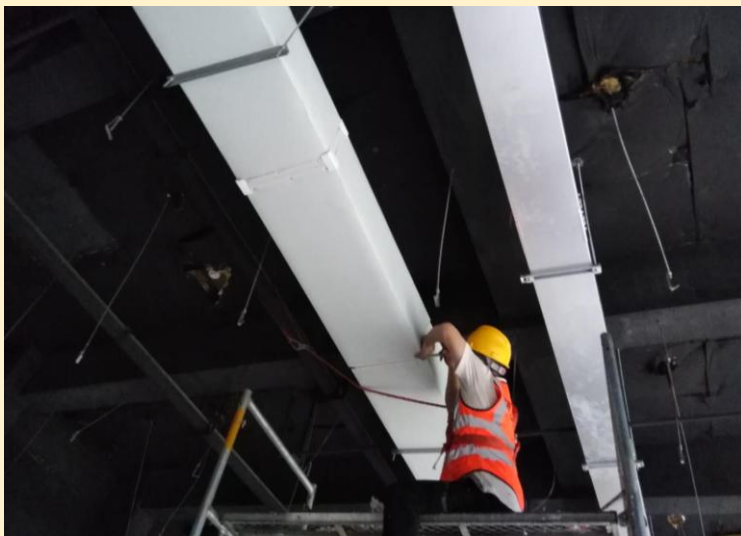

副馆弱电桥架安装施工。



电梯基础结构施工。

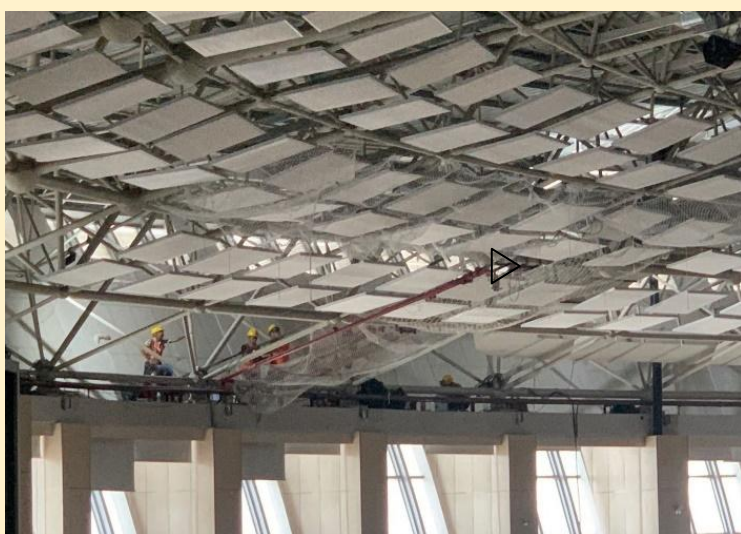

主馆新增马道制作安装施工。


主馆北侧新增安保控制室墙体安装施工。



主、副馆风管加工制作。



副馆消防管安装施工。

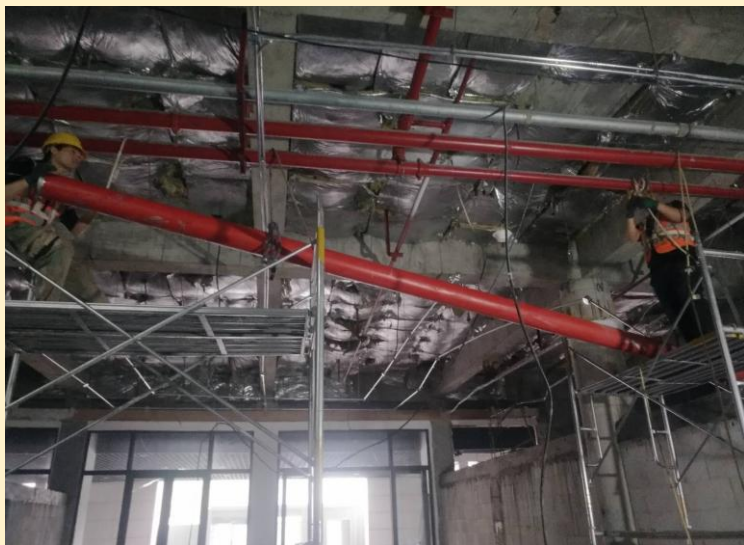




👉 室外管沟开挖施工。



👉 室外消防管道敷设施工。

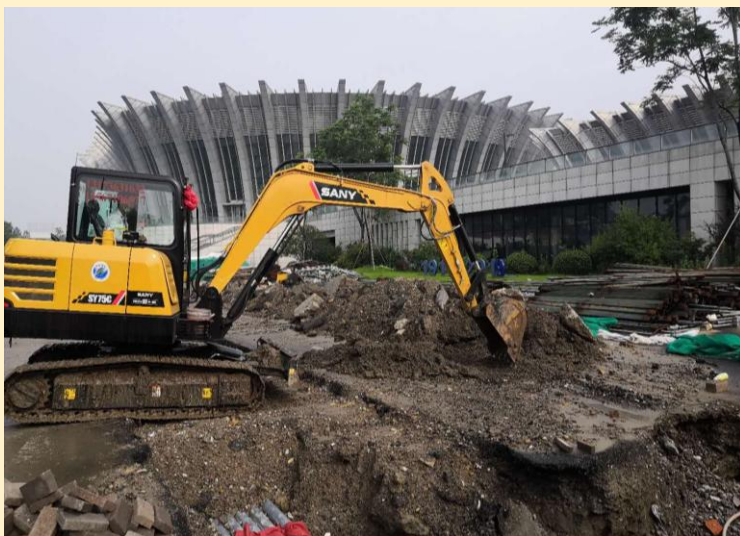

👉 室外管沟土方回填。

工作检查

👉 亚组委场馆部对项目施工进度进行了检查。



👉 质监站对项目进行了“星期天”工程师专项检查。



👉 省纪委有关领导至项目现场调研指导。



👉 教育厅领导对项目复工以来的工程进度情况进行了检查。





亚组委场馆部对本项目进行了档案、建筑材料工程资料专项检查。

钱塘新区公安局（右图上）和市公安局（右图下）分别至项目部了解工程情况和协调场馆安保相关事宜。



安全防疫

为了确保施工现场的安全，继续落实好防疫工作。校建处会同学校纪检办、保卫处、后勤中心及疫情防控办等相关部门于4月13日、5月28日、6月24日对施工现场进行了安全文明施工及防疫专项检查。检查中发现门卫人员在出入健康码登记上不够完整、消防设施及生活区灭火器设置不规范、现场人员不会正确使用消防器材等相关问题。经校建处现场管理人员督促，施工单位已进行上述问题的整改，目前总体落实情况较好。



入口体温、绿码登记情况检查



生活区灭火器设置情况检查

微型消防站设置检查



消防演习



送：学校校领导

发：学校亚运会筹办工作领导小组成员、校建处全体成员
